AISTAV · HARMONOGRAM PRO KLIENTA

Bytový dům Na Výsluní

Ukázková zakázka · rekonstrukce bytového domu · 24 bytů · 4 patra


Zahájení	Předání	Délka	Patra	Další patro
1. 3. 2027	1. 12. 2027	40 týdnů	4 patra	po 2 týdny

- A Parta A · Bourání + odvoz suti · 2 týdny / patro
- B Parta B · Rozvody vody a odpadů · 2 týdny / patro
- C Parta C · Elektro, hrubá instalace · 2 týdny / patro
- D Parta D · Zdění příček · 2 týdny / patro
- E Parta E · Sádrokartony a podhledy · 1 týden / patro
- F Parta F · Omítky a štuky · 2 týdny / patro
- G×2 Parta G · Obklady stěn · 3 týdny / patro · 2 party se střídají
- H Parta H · Anhydritové podlahy · 1 týden / patro
- I Parta I · Dlažba a vinyl · 2 týdny / patro
- J Parta J · Malby · 2 týdny / patro
- K Parta K · Dveře a zárubně · 1 týden / patro
- L×2 Parta L · Sanita, radiátory, kompletace · 3 týdny / patro · 2 party se střídají

Jak číst: písmeno = parta · šířka bloku = jak dlouho práce trvá · šedý pruh = čekání (schnutí, dovolená) · ✓ = patro hotové.

Týden stavby · pondělí	březen 2027				duben 2027					květen 2027				červen 2027				červenec 2027					srpen 2027				září 2027					říjen 2027				listopad 2027				pro
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	1.3.		15.3.		29.3.		12.4.		26.4.		10.5.		24.5.		7.6.		21.6.		5.7.		19.7.		2.8.		16.8.		30.8.		13.9.		27.9.		11.10.		25.10.		8.11.		22.11.		

PATRA · CO SE KDE DĚLÁ (písmeno = parta)

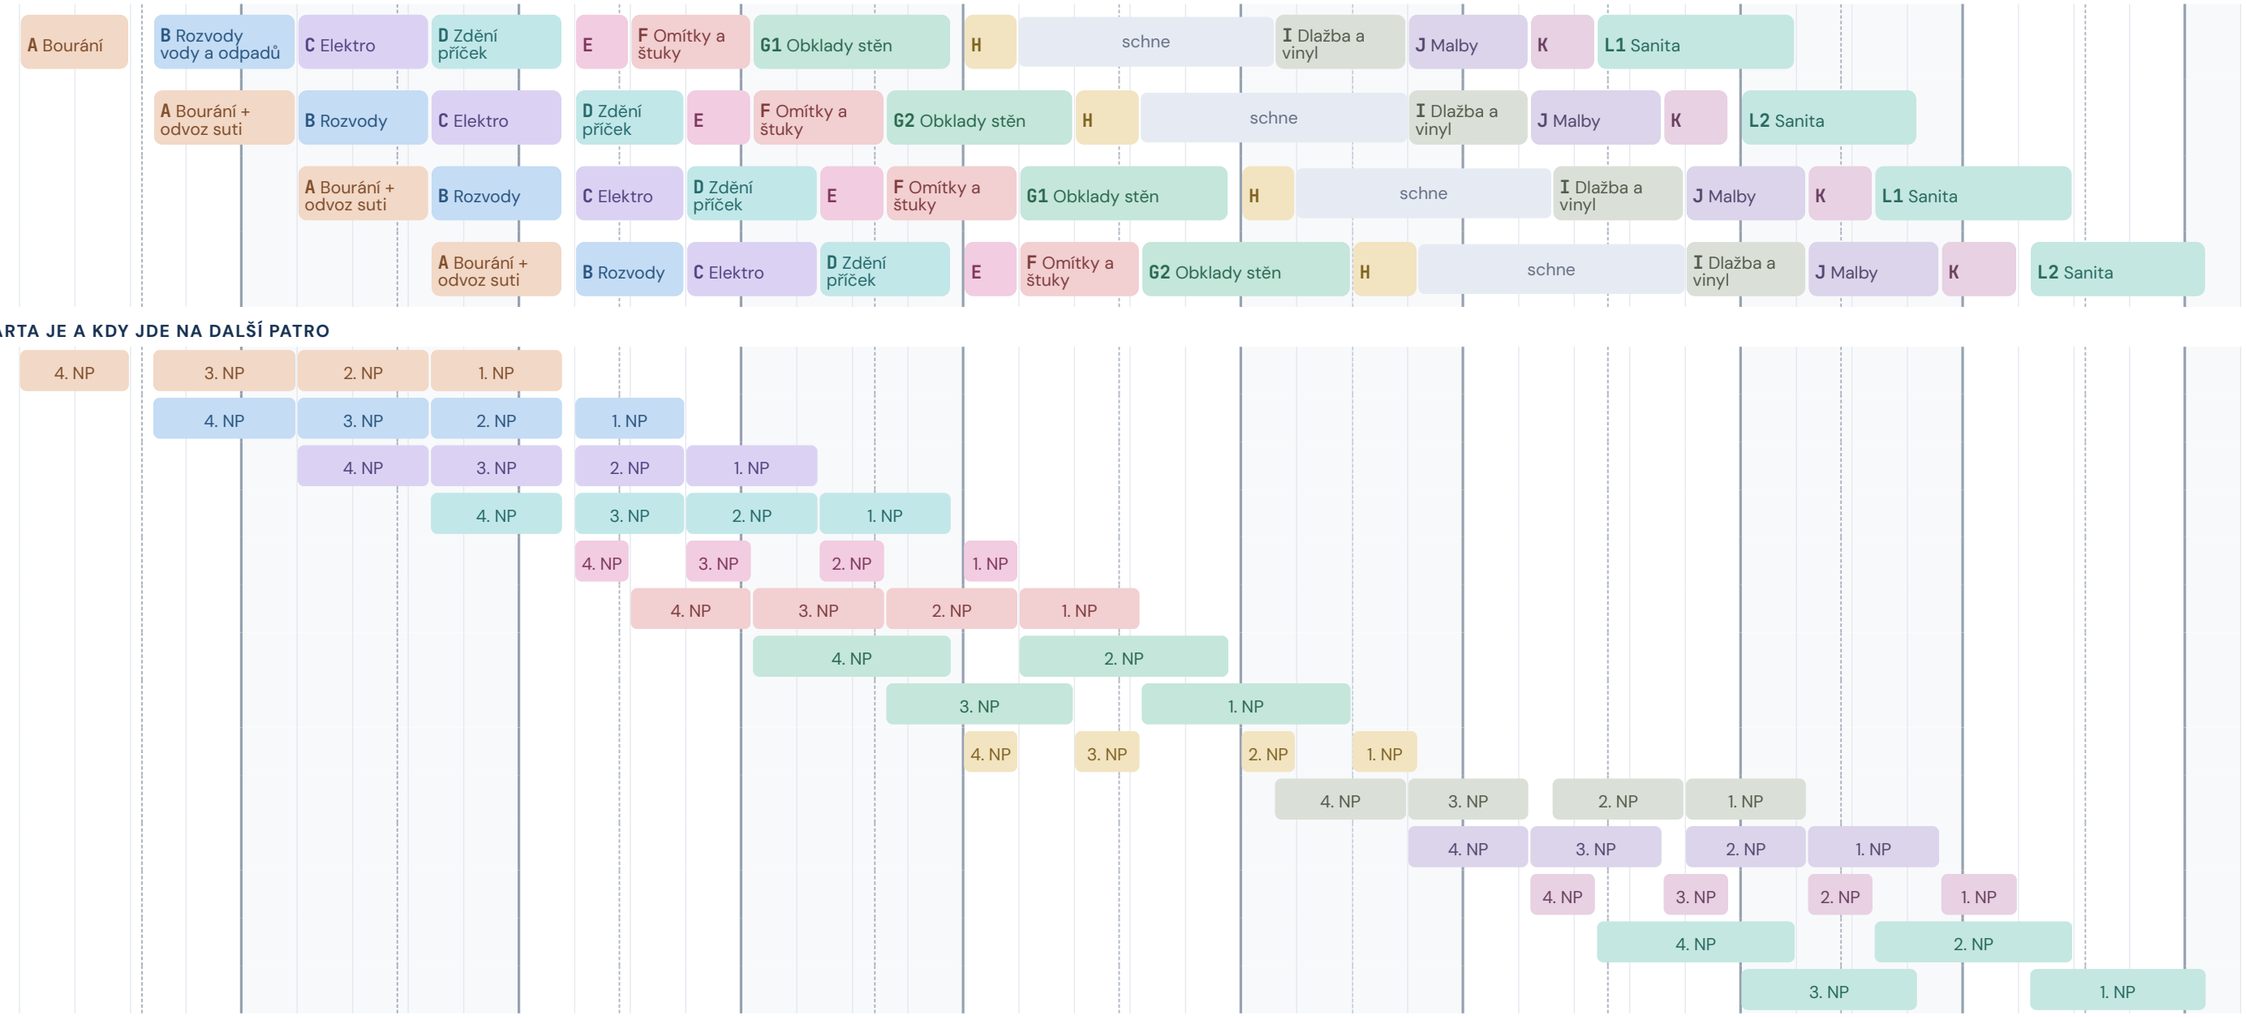

PARTY · KDE KTERÁ PARTA JE A KDY JDE NA DALŠÍ PATRO

Milníky

- ✓ 4. NP
- ✓ 3. NP
- ✓ 2. NP
- ✓ 1. NP
- Předání 1. 12.
