AISTAV · HARMONOGRAM PRO KLIENTA

Bytový dům Na Výsluní


Ukázková zakázka · rekonstrukce bytového domu · 24 bytů · 4 patra

Zahájení	Předání	Délka	Patra	Další patro
1. 3. 2027	1. 12. 2027	40 týdnů	4 patra	po 2 týdny


- A Bourání + odvoz suti · 2 t / patro
- B Rozvody vody a odpadů · 2 t / patro
- C Elektro, hrubá instalace · 2 t / patro
- D Zdění příček · 2 t / patro
- E Sádrokartony a podhledy · 1 t / patro
- F Omítky a štuky · 2 t / patro
- G×2 Obklady stěn · 3 t / patro
- H Anhydritové podlahy · 1 t / patro
- I Dlažba a vinyl · 2 t / patro
- J Malby · 2 t / patro
- K Dveře a zárubně · 1 t / patro
- L×2 Sanita, radiátory, kompletace · 3 t / patro

Týden stavby · pondělí	bře 27				duben 2027					kvě 27					čvn 27				červenec 2027					srp 27				září 2027					říj 27					lis 27					pro
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	1.3.		15.3.		29.3.		12.4.		26.4.		10.5.		24.5.		7.6.		21.6.		5.7.		19.7.		2.8.		16.8.		30.8.		13.9.		27.9.		11.10.		25.10.		8.11.		22.11.	

PATRA · CO SE KDE DĚLÁ (písmeno = parta)



PARTY · KDE KTERÁ PARTA JE A KDY JDE NA DALŠÍ PATRO

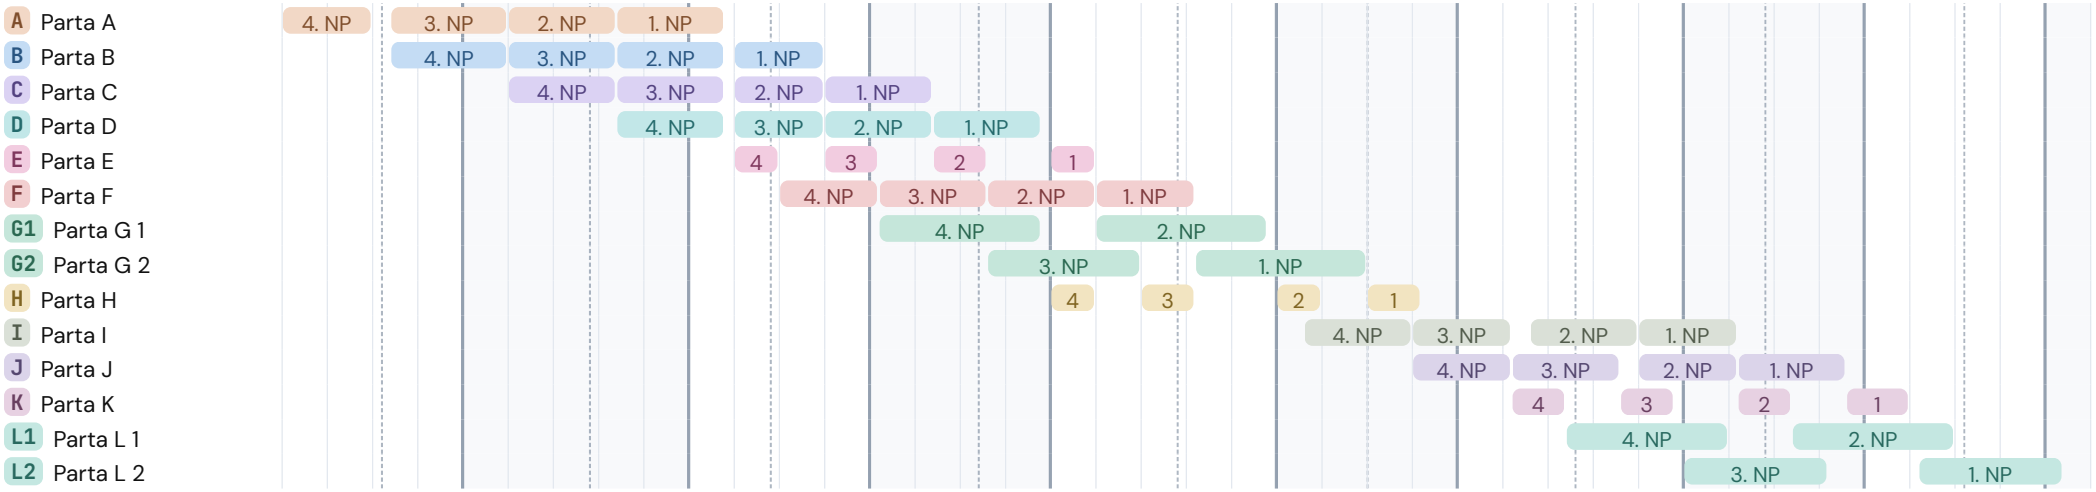

Milníky

✓ ✓ **Předání 1. 12.**
